


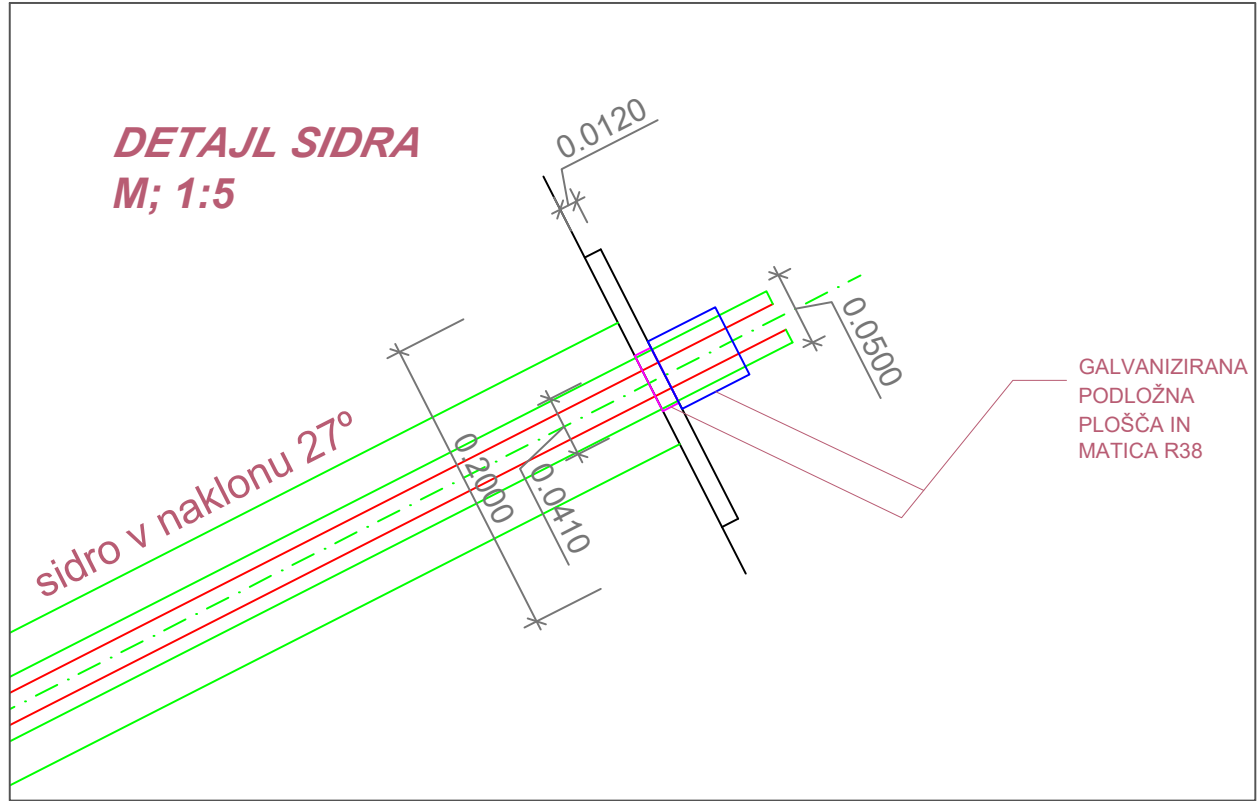

1. faza: izkop po kampдах za izvedbo sidranja in kamnite zložbe. Takoj po izkopu ene kampade v širini B $\geq 2,0$ m, se izvede prekritje izkopa z drenažnim kompozitom ter izvede primarno oblogo brežine: pritrdi mrežo Q 196, z RA L = ca 5 m in prebrizga z betonom C20/25 z dodatki proti zmrzovanju in odpornosti s mikrovlakni EN 1504-9 (predlog Sicacrete), obrzig 2 x po 5-7 cm, po mokrem postopku.
2. faza: izvedba jeklinčnih sidr (sprotno jekliniranje pri vrtanju) ter pritrditev z maticami prek hladno podajnih plošč na primarno oblogo (detalji).
3. faza: izvedba mikropilotov, podložnega betona in AB grede po segmentih
4. faza: polaganje dvoslojne drenažne cevi, ki se jo ovije v drenažni kompozit
5. faza: gradnja kamnite zložbe v betonu C 20/25. Razmerje kamni d = 0,3 – 0,5 m 70 %, beton 30 %.
6. faza: izvedba armirane zemljine z ojačitveno folijo s prepleki (detalji) ter sprotno utrjnim zasutjem kamniti drobljenc, frakcije 10-64mm) v višini po 0,50m
7. faza: vgradnja pritrdilnih sidr in vegetacijskih jeder iz kosovne mreže napolnjene s humusom in ustrezno izbranimi semeni za primerno vegetacijo (v skladu s pogoji ZVKND)

 GEOENG&CO. d.o.o.		Investitor: OBČINA RADOVLJICA Gorenjska cesta 19 4240 Radovljica
Vodja projekta:	dr. D. OCEPEK, univ. dipl. inž. geol.	Objekt/ lokacija: PLEČNIKOV PAVILJON BEGUNJE parc. št. 325/1, 325/, k.o. 2151 Begunje
Ident. št. IZS:	RG 0085	
Pooblaščen inž.:	JASNA JERMAN, univ. dipl. inž. geol.	Vrsta načrta: 7.0 GEOTEHNIČNI NAČRT SANACIJE BREZINE IN ZAŠČITA PRED HIDROLOŠKIMI VPLIVI
Ident. št. IZS:	RG 0076	
Sodelavka:		Vsečina risbe: KARAKTERISTIČNI GEOTEHNIČNI PREČNI PREREZ P1
Sodelavec:		
Vrsta gradnje:	SANACIJA	Del risbe:
Vrsta proj. dokument:	PZI	
Številka projekta:	5/19	Merilo: 1 : 100
Številka načrta:	30a/20-PZI	
Šifra CC:		Datum: september 2022
Avatar risbe:	GEOENG & Co. d.o.o.	Številka risbe: G.2
		Id. št. risbe: BEGUNJE-PLEČNIKOV PAVILJON IZMSO_geo_PZI-sprememba2.dwg
